


BŪVNICĪBAS ĢENERĀLPLĀNS M 1:500

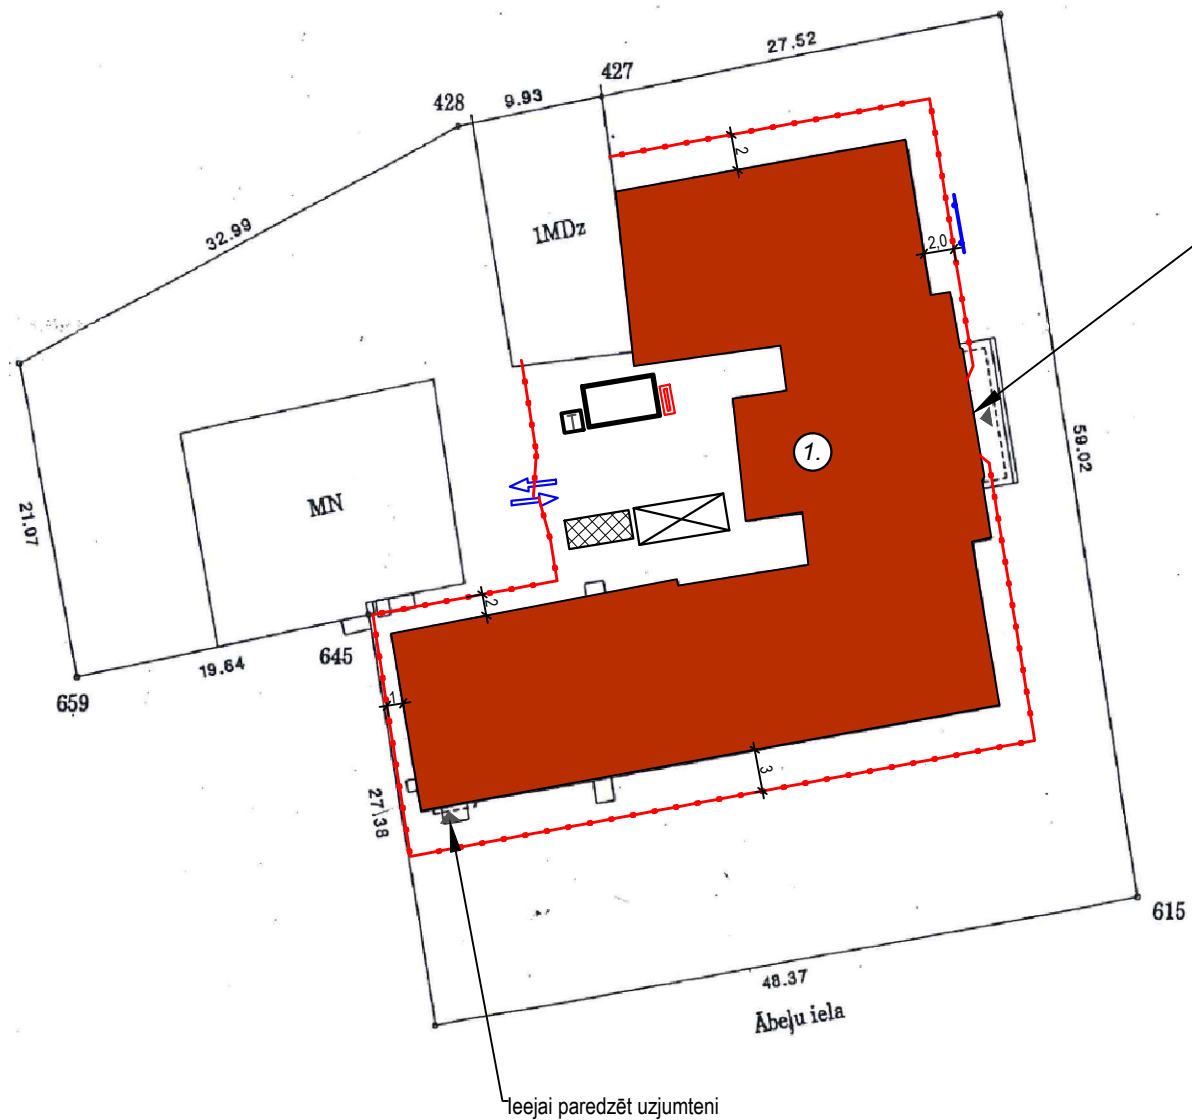

Pieņemtie apzīmējumi	
①	Administratīvā ēka
	Būvmateriālu nokrautnes
	Pagaidu instrumentu novietne
	Būvgružu konteineri
	Biotualetes
	Būvtāfele
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums h=2m
	Būvtehnikas kustības virziens būvlaukumā
	Ugunsdzēsības stands

PIEZĪMES:

- Līdz darbu sākumam nepieciešams:
 - ierīkot būvlaukuma nožogojumu, saskaņā ar celtniecības ģenerālplānu;
 - pie ieejām uzstādīt uzjumteņus
 - ierīkot iebrauktves un izbrauktves, uzstādīt ceļa zīmes un brīdinājuma zīmes;
 - iepazīstināt ar doto projektu:
 - brigadieriem
- Elektroapgādi veikt no esošās administratīvās ēkas.
- Ūdensapgādi veikt no esošās administratīvās ēkas ūdensapgādes sistēmas.
- Pie iebrauktves (nobrauktves) uz būvlaukuma teritoriju, kā arī visos celtniecības posmos, kur ir nepieciešams pēc darba nosacījumiem, uzstādīt labi redzamas un dienas tumšajā laikā apgaismotas brīdinājuma un norādījuma zīmes.
- Būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā, izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.
Pie ieejām uzstādīt uzjumteņus
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbus.

	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 64825679 Reg.Nr. 55403015621, Bra.,Nr. 1200-R		Novada domes ēkas jumta vienkāršota atjaunošana	
	Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME		Adrese:	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads
PGA	J. Moris	04.08.2015.	Rasējums:	
Projektēja	J. Moris	04.08.2015.	BŪVNICĪBAS ĢENERĀLPLĀNS	
Izstrādāja	E.Simsons	04.08.2015.	Mērogs:	1:500
			Dat:	08.15.
			Lapa:	DOP-01
			Lapas:	1
